Kunde: Færgebakkernes Vandværk
Projekt: Ombygning af vandværk til lukket filteranlæg 2025
Projektnummer: 2025115
Dato: 28-08-2025 Revision:

FR. DAHLGAARD AS VANDVÆRKSINDUSTRI — GRUNDVAND TIL DRIKKEVAND
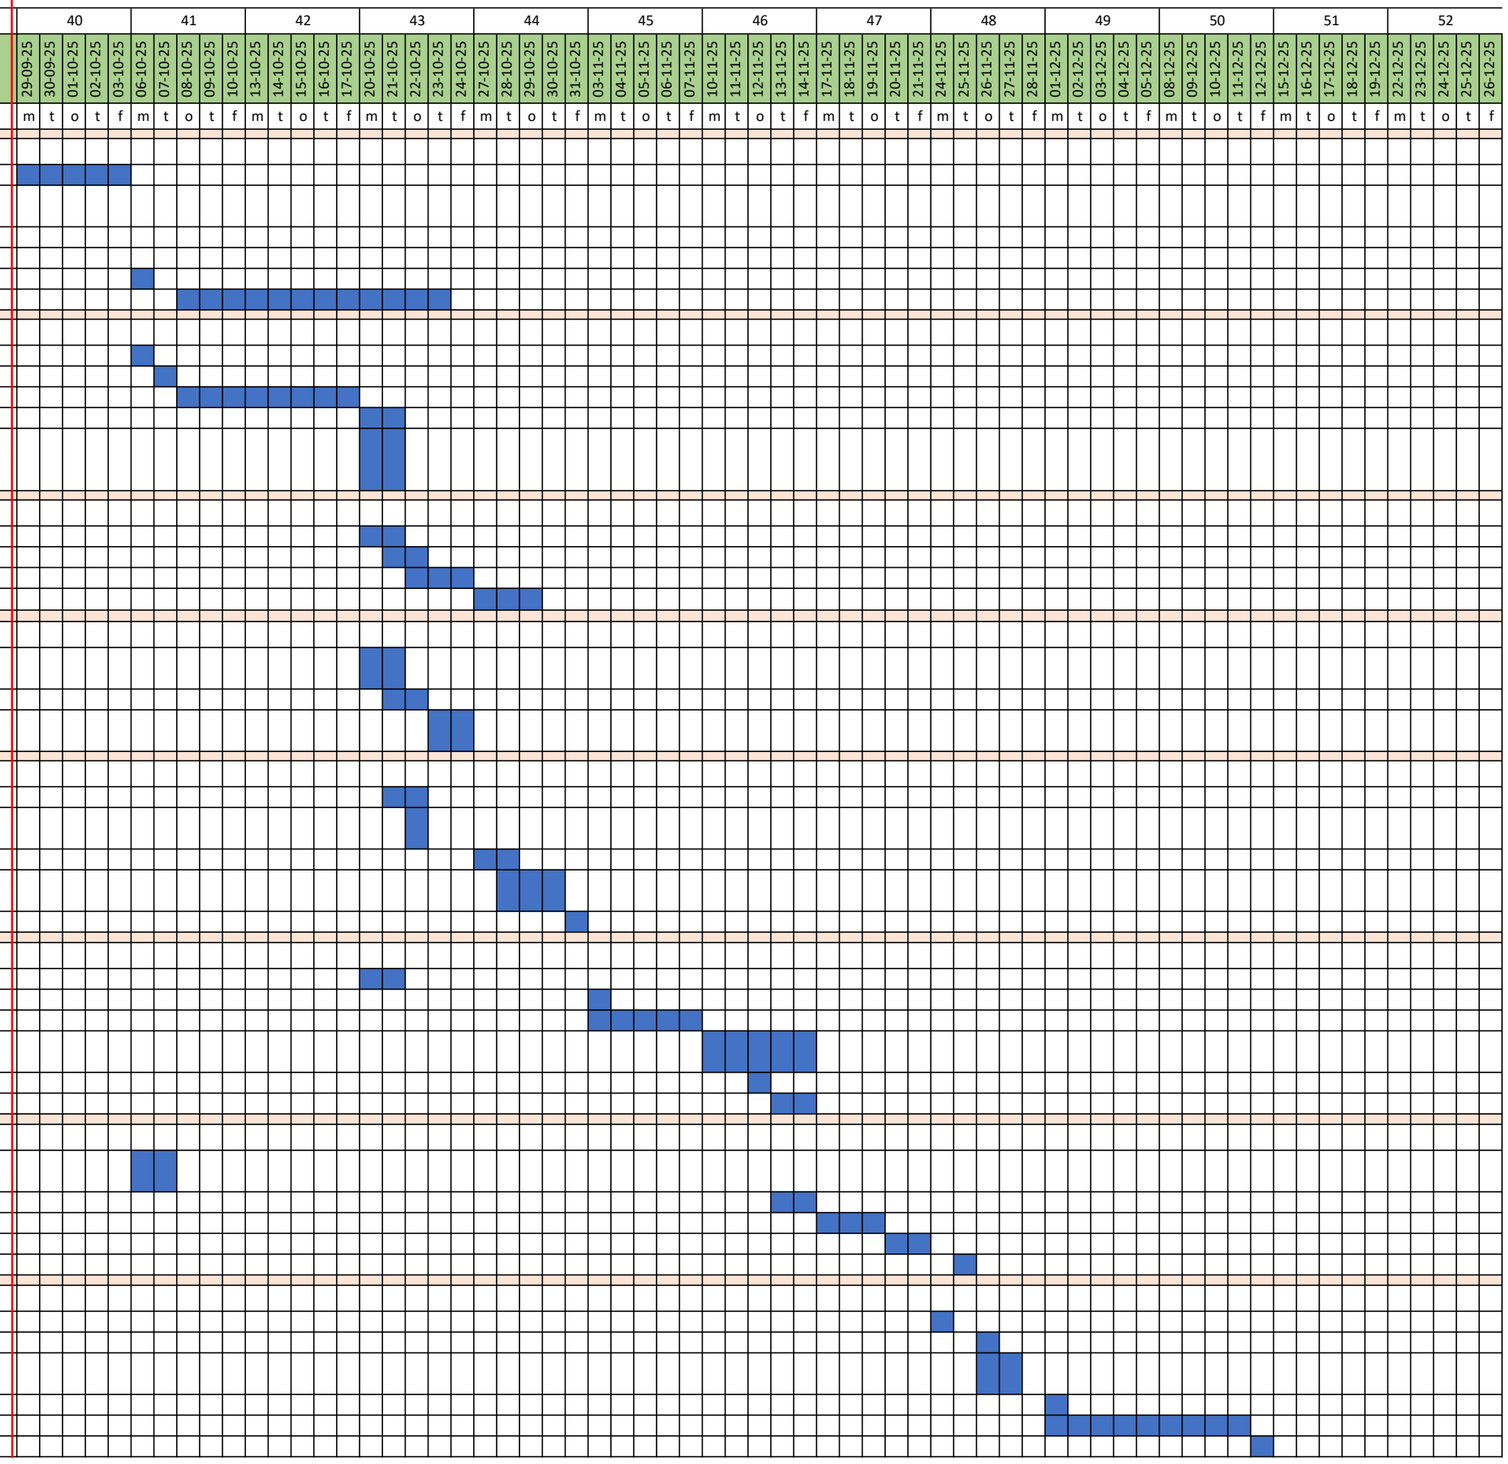
		Status	Projektstart	29-09-2025	
			Start	Varighed	Slut
Projekt					
Projektudarbejdelse		80%	29-09-2025	5	04-10-2025
Ansøgning kommune om udledningstilladelse i fbm. opstart			01-09-2025		01-09-2025
Ansøgning om arbejdsgarantil			01-09-2025		01-09-2025
Anstilling af byggeplads:					
- Toiletvogn - hele byggeperioden			06-10-2025	-	06-10-2025
- Container til betonaffald			08-10-2025	15	23-10-2025
Nedbrydning					
Bortskaffelse af filtermateriale	Slamsuger		06-10-2025	-	06-10-2025
Demontering af rørsystem på filterfront			07-10-2025	-	07-10-2025
Nedbrydning af beton			08-10-2025	11	19-10-2025
Sandblæsning af vægge i tårn og filterområde			20-10-2025	1	21-10-2025
Fjerne råvandsrør og nuværende skyllevandsrør i rentvandsbeholder samt tilstøbning af huller i vægge og gulv			20-10-2025	1	21-10-2025
Bygningsarbejde					
Lukning af huller i tårn	Murer		20-10-2025	1	21-10-2025
Forbered vægge til maler	Murer		21-10-2025	1	22-10-2025
Udbedring af gulv	Murer		22-10-2025	2	24-10-2025
Maling af vægge			27-10-2025	2	29-10-2025
Jordarbejde					
Gravearbejde ved vandværk - skyllevandsafgang og råvandsindføring			20-10-2025	1	21-10-2025
Gravearbejde for boringer - fjerne betonringe			21-10-2025	1	22-10-2025
Etablering af gruspude på boringer efter omlægning af rør i jord			23-10-2025	1	24-10-2025
Boringer					
Etablering af opføringsrør på boringer			21-10-2025	1	22-10-2025
Omlægning af råvandsledning og elkabel til boringer			22-10-2025	-	22-10-2025
Levering og placering af råvandsstationer			27-10-2025	1	28-10-2025
Montering af nye råvandspumper og bestykning af råvandsstation			28-10-2025	2	30-10-2025
Elarbejde i råvandsstation	BC		31-10-2025	-	31-10-2025
Procesanlæg					
Omlægning af rør ud af rentvandsbeholder			20-10-2025	1	21-10-2025
Levering og placering af filtre			03-11-2025		03-11-2025
Opbygning af rørsystem for behandlingsanlæg			03-11-2025	5	08-11-2025
Montering af skyllevandspumpe, skylleluftsblæser og kompressorenhed			10-11-2025	5	15-11-2025
Bestykning af filtre, dyser, luftudlader			12-11-2025	-	12-11-2025
Ilægning af filtermateriale			13-11-2025	1	14-11-2025
Elarbejde					
Nedtagning af el- og etablering af bygstrømstavle	BC		06-10-2025	1	07-10-2025
Montering af ny el- og styretavle	BC		13-11-2025	1	14-11-2025
Etablering af nye føringsveje for kabler	BC		17-11-2025	2	19-11-2025
Tilslutning af motorer og instrumentering	BC		20-11-2025	1	21-11-2025
Opstart og test af anlæg - SAT	BC + FRD		25-11-2025	-	25-11-2025
Opstart og indkøring					
Rengøring og oprydning på vandværk			24-11-2025	-	24-11-2025
Rengøring og desinficering af procesanlæg			26-11-2025	-	26-11-2025
Opstart af vandværk med interimsproduktion til fjorden			26-11-2025	1	27-11-2025
Slutrengøring på vandværk			01-12-2025	-	01-12-2025
Vandprøver			01-12-2025	10	11-12-2025
Afleveringsforretning			12-12-2025	-	12-12-2025
